



# FLORIAN GmbH


Vereinigung der Mainzer Schornsteinfeger

WÖHLER MGKG  
DC 100 pro

Schützenstraße 41  
D-33181 Bad Wünnenberg  
Tel.: +49 (0) 2953/73211  
Fax: +49 (0) 2953/73250

## 4-Pa-Test

Wöhler DC 100 pro D 6.07  
Serien-Nr.: 2101

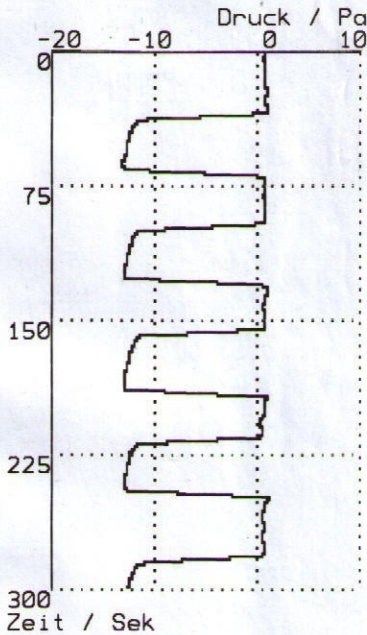

Startdatum: 23.12.08  
Startzeit: 09:27:42  
Stoppdatum: 23.12.08  
Stoppzeit: 09:32:42  
Lograte: 1 Sek

Minimum: -12.78 Pa  
Maximum: 1.63 Pa  
Differenz: 14.41 Pa

Anlage:

Name: Haus Testmann  
Str: Teststraße 11  
PLZ: 55124 Mainz -  
Ort: Gonsenheim

Prüfer:

Name: Jörg Mehlert  
Datum: 23.12.08  
Unterschrift:

23.12.08

## Messtechnische Beurteilung des Unterdrucks von Feuerstätten in Nutzungseinheiten mit Raumluft absaugenden Einrichtungen

# Messprotokoll

Verwendetes Messgerät: Wöhler DC 100 pro Serien-Nr. 2101

Ort der Messung:	PLZ Ort	55124 Mainz-Gonsenheim
	Straße	
	Wohnung Mieter	
Datum der Messung	23.12.2008	
Uhrzeit Messbeginn	9.27 Uhr	
Uhrzeit Messende	9.32 Uhr	

Der Unterdruck im Aufstellungsraum lag während der durchgeführten Messung nicht beständig unter 4 Pa.

Der sichere Betrieb der Feuerstätte und der Luft absaugenden Anlage ist gleichzeitig **nicht** möglich.

Name Prüfer	Jörg Mehlert
Datum	23.12.2008
Unterschrift	
Auftraggeber für die Messung	Haus Testmann
Straße Hausnummer	Teststraße 11
PLZ Ort	55124 Mainz-Gonsenheim

Das Messergebnis stellt die Beurteilung des Momentanzustandes unter Beachtung der bei der Prüfung vorhandenen, das Ergebnis beeinflussenden Geräte (Feuerungsanlagen und Luft absaugende Einrichtung(en)) und dem Zustand der Gebäudehülle (Fenster und Türen) dar. Bei einer Änderung an der Feuerstätte, luftabsaugenden Geräte oder an der Gebäudehülle ist eine erneute Bewertung erforderlich!
